

ANEXO 18F – FISCALIZAÇÕES ORDENDADAS

ANEXO 18F - VIII FISCALIZAÇÃO ORDENADA

➤ GCM do Bairro do Jardim Rancho Alegre

Foto: ART do fiscal responsável pelo acompanhamento da execução da obra



TERMO DE DESIGNAÇÃO

Fica designada a servidora Vivian Cristina Matiassi do Carmo, Prontuário: 29442 Engenheira Civil com CREA nº 5062920404 representante da prefeitura de Santana de Parnaíba a acompanhar e fiscalizar a execução da Construção de Base da Guarda Municipal e Galpão de Utilidades, no Bairro Jardim Rancho Alegre, sob o contrato nº 100/2018 tomada de preços 005/2018 com ordem de serviço de 05/06/2018.

Santana de Parnaíba, 01 de Abril de 2019.

EVANDRO BARROS FERNANDES
Secretário Municipal de Obras

Foto: Contratante designou fiscal credenciado junto ao CREA para acompanhar a execução da obra

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230190691309

Complementar - obra/serviço vinculada à ART
cargo/função à 28027230161359980

1. Responsável Técnico

VIVIAN CRISTINA MATIASSI

Título Profissional: Engenheira Civil

RNP: 2607869234

Registro: 5062920404-SP

Registro:

Empresa Contratada:

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba

CPF/CNPJ: 46.522.983/0001-27

Endereço: Rua PEDRO PROCÓPIO

Nº: 213

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Santana de Parnaíba

UF: SP

CEP: 06501-130

Contrato:

Celebrado em: 01/04/2019

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ 1,00

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Rua CALIFORNIA

Nº:

Complemento:

Bairro: JARDIM RANCHO ALEGRE

Cidade: Santana de Parnaíba

UF: SP

CEP: 06515-240

Data de Início: 06/06/2018

Previsão de Término: 06/06/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Fiscalização	Execução	Edificação	Quantidade	Unidade
1			1128,51000	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Fiscalização da obra CONSTRUÇÃO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL E GALPÃO PARA UTILIDADE DIVERSAS a partir do dia 01/04/2019

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 2/2

7. Entidade de Classe

129 - SANTANA DO PARNAÍBA - ASSOCIAÇÃO BANDEIRANTE DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRONOMOS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ data _____ de _____

VIVIAN CRISTINA MATIASSI - CPF: 376.214.738-86

Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba - CPF/CNPJ: 46.522.983/0001-27

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confesa.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 17 18 11
E-mail: acessarlink Fale Conosco do site acima



Valor ART R\$ 85,96

Registrada em: 07/06/2019

Valor Pago R\$ 85,96

Nosso Número: 28027230190691309

Versão do sistema

Impresso em: 10/06/2019 08:12:31

Cronograma apresentado pela Contratada

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO
VALORES FORMAS FUNDADAÇÃO														
ESTRUTURA														
OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS														
COBERTURAS														
ESQUADRIAS DE MADEIRA														
CAMILHOS														
PORTAS ESPECIAIS														
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS														
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS														
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS														
FORRO														
LASTROS E ENCHIMENTOS														
REVESTIMENTO DE PISOS														
VIDROS														
PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO														
PINTURA EM MADEIRA														
LIMPEZA														
COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO														
SUB TOTAL GERAL GALPÃO-LOJAS														
BDI (10%)														
TOTAL GERAL														
BDI (10%)														
TOTAL GERAL														

Cajamar, 27 de Abril de 2019.

Construtora Joia Brasil Ltda Epp
 CNPJ: 10.902.342/0001-50
 Adelson Luis Steffens
 RG: 50.394.482-8 CREA: 5060121458

Medição efetuada pela Prefeitura

SANTANA DE PARNAÍBA

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO – BASE DA GUARDA E GALPÃO
 8ª Medição

Santana de Parnaíba, 05 de Abril de 2019.

Valor de Contrato: R\$ 1.199.601,51
 Valor do Contrato + 1º Aditivo: R\$ 1.244.758,81
 Valor do Contrato + 2º Aditivo: R\$ 1.494.660,99

Medição Atual: R\$ 104.397,86, equivalente a 6,98% do total.

Montante Pago: R\$ 454.018,79, equivalente a 30,38% do total.

Montante Acumulado: R\$ 558.416,62, equivalente a 37,36% do total.

Estágio da Obra: 40 %

PERCENTUAL DA OBRA À CONCLUIR: 60 %

Atenciosamente,

Eng. Civil Vivian Cristina Matias do Carmo
 Eng. Civil Vivian Cristina Matias do Carmo
 CREA Nº 5062920404

EVANDRO BARROS FERNANDES
 Secretário Municipal de Obras

www.santanadeparnaiba.sp.gov.br Prefeitura de Santana de Parnaíba

Medição efetuada pela Prefeitura

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

MEMORANDO N.º 0900/2019 – SMO
 (O.S. n.º 39.370/2019)

Santana de Parnaíba, 08 de abril de 2019.

À
Secretaria Municipal de Finanças
Sr. Vaumil Antônio Pontes

Prezado Senhor,

Com meus cumprimentos iniciais, venho por intermédio deste, encaminhar a Vossa Senhoria, **Nota Fiscal nº 367** da empresa **CONSTRUTORA JOIA BRASIL LTDA. EPP**, no valor de **R\$ 104.397,86** e planilha de medição dos serviços executados no período de 01/02/2019 a 28/02/2019 (**8.ª medição**), referente ao **Contrato nº 100/2018** (Construção da Base da Guarda Municipal e galpão do Parque Santana). Portanto, segue para conhecimento e demais providências quanto ao pagamento.

Certo da compreensão coloco-me a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

EVANDRO BARROS FERNANDES
 Secretário Municipal de Obras

ELVIS LEONARDO CEZAR
 Prefeito Municipal

Abaixo anexamos fotos da atual situação da obra, quando da visita realizada pela fiscalização no dia 29/05/2019.



➤ UBS do Bairro Refúgio dos Bandeirantes

Prazo de vigência do contrato

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Secretaria Mun. de Compras e Licitações
Processo nº 202/17
Fls. nº 754
Pront. 17879 - Arnaldo Diego M. D. Cruz

CONTRATO Nº 140/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
CONTRATADA: COPLEM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 46.522.983/0001-27, com sede na Praça Monte Castelo, nº 04, Centro, Santana de Parnaíba/SP, neste ato representada por seu Prefeito Municipal **ELVIS LEONARDO CEZAR**, doravante denominada simplesmente "CONTRATANTE", e, de outro lado a Empresa **COPLEM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.178.331/0001-41, estabelecida na Rua Jovita, nº 476, 2º andar, Santana, São Paulo/SP, CEP-02036-001, neste ato representada por seu Sócio o Senhor **JOSÉ FERNANDO DE CASTRO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.878.307-8-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 165.901.978-81, doravante denominada simplesmente "CONTRATADA", que por força do Proc. Adm. nº 827/17, que cuidou da Tomada de Preços nº 010/17, na presença de duas testemunhas ao final assinadas, ficou justo e contratado o seguinte, que mutuamente outorgam e aceitam, a saber:

CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia para a **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**, sito à Avenida Ouro Branco, s/n - Refúgio dos Bandeirantes - Santana de Parnaíba/SP, nos termos da Proposta Comercial apresentada pela Contratada e nas especificações e condições que trata o Edital de **Tomada de Preços nº 010/2017**, os quais fazem parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA II - DO PRAZO
2.1. O prazo de vigência deste contrato será de até 12 (doze) meses, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço.

CLÁUSULA III - DO VALOR CONTRATUAL
3.1. O presente instrumento tem o valor total de **R\$ 833.575,45** (oitocentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

CLÁUSULA IV - DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1. As despesas com a execução deste instrumento correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 0216-4.4.90.51.99-1030100771092, do orçamento vigente.

CLÁUSULA V - DO REGIME DE EXECUÇÃO
5.1. O regime será sob o regime de empreitada por preços unitário.

Data da assinatura do Contrato

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Secretaria Mun. de Compras e Licitações
Processo nº 202/17
Fls. nº 754
Pront. 17879 - Arnaldo Diego M. D. Cruz

CLÁUSULA XIV - DADOS DO RESPONSÁVEL PELO AJUSTE
14.1. Para informar eletronicamente todos os processos e licitação via Sistema AUDES (conforme os critérios previstos no Comunicado GP 14/2016, publicado no DOE de 24/06/2016), em atendimento às novas exigências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, seguem os dados do responsável pelo ajuste:
Nome: José Fernando de Castro
Cargo: Sócio
CPF: 165.901.978-81
Data de nascimento: 15/12/1971
E-mail particular: zefernando@coplem.com.br
E-mail profissional: coplem@coplem.com.br

CLÁUSULA XV - DO FORO
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, para dirimir as eventuais dúvidas surgidas na execução deste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim justos e contratados, firmam as partes este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas adiante identificadas.

Santana de Parnaíba, 08 de Novembro de 2017.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

JOSÉ FERNANDO DE CASTRO
Sócio

Testemunhas:
1. **Arnaldo Sales**
RG-15.903.273

2. **Érica Soares de Lima Oliveira**
RG-27.638.746-6

Ordem de Serviço

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Secretaria Mun. de Compras e Licitações
Processo nº 202/17
Fls. nº 754
Pront. 3361 - Ana M. de Barros

ORDEM DE SERVIÇO Nº 001 - C140-2017

CONTRATADA: COPLEM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.
CONTRATO N.º 140/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITO À AVENIDA OURO BRANCO, S/N, NO BAIRRO REFÚGIO DOS BANDEIRANTES, SANTANA DE PARNAÍBA/SP, CONSTANTES DA TOMADA DE PREÇOS nº 010/17.

Fica essa empresa **NOTIFICADA**, a iniciar as **obras de construção da unidade básica de saúde**, localizada no endereço supracitado, conforme **Processo Administrativo nº 827/17** e **TOMADA DE PREÇOS nº 010/17**, sendo que a presente ordem compreende:

PRAZO: 12 (DOZE) meses.

VALOR: R\$ 833.575,45 (Oitocentos e trinta e três mil, Quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

Deverá ser agendada visita preliminar acompanhada da fiscalização para definir a prioridade/seqüência dos serviços.

Nenhum serviço adicional será executado ou substituído sem prévia autorização da Secretaria Municipal de Obras.

É obrigatório o fornecimento e a fixação da placa indicativa da obra 5(cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço.

Santana de Parnaíba, 20 de Novembro de 2.017.

EVANDRO BARROS FERNANDES
Secretário Municipal de Obras

Recebi em 20/11/17
DANIEL AUGUSTO
Nome legível
Assinatura

Medição publicada em 22/10/2018, um mês antes do prazo contratual expirar

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAIBA

Secretaria Municipal de Compras e Licitações
Processo nº 015
Fls. nº 173
Pront. 3381 - Ana M. de Barros

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

UBS REFÚGIO

Santana de Parnaíba, 22 de Outubro de 2018.

Valor Licitado: R\$ 833.575,45

Medição Atual: R\$ 90.202,81

Porcentagem da Medição Atual Equivalente a 10,8 % do total.

Montante Pago (MEDIÇÕES): R\$ 417.845,13

Porcentagem do Montante Pago: 50,13%

ESTÁGIO DA OBRA (a concluir): 48%

Atenciosamente,

ENG. HENRIQUE BARBOSA SANTOS
CREA 5069697822

EVANDRO BARROS FERNANDES
Secretário Municipal de Obras

Cronograma apresentado pela Contratada

Rua Jorjão, 476 - 2º Andar - Santana - CEP 02036-001 - São Paulo - SP - FONE: 3876-1160 - E-mail: compras@coplem.com.br

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO Nº 015
Fls. Nº 173
Pront. 17879 - Amílcar Diego M. D. Cruz

Nº da Operação: 15383.468001/16-0003
Gestor/Programa/Modalidade/Ação: MS / Requalificação UBS - Construção
Município/UF: Santana de Parnaíba / SP
Localidade: Rua do Cristal, Bairro Refúgio

Proponente: Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba
Objeto: Implantação de UBS no Bairro Refúgio
Empreendimento/Apelido: Implantação de UBS no Bairro Refúgio

META/AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4					
				PARCELA (R\$)	ACUM (R\$)										
1	CONTRIBUIÇÃO DA UBS REFÚGIO			100,00	100,00										
11	PROJETOS EXECUTIVOS	14.371,14	1,72%			15,00	15,00	15,00	30,00	85,00	100,00				
12	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.712,03	0,81%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
13	LIMPEZA DO TERRENO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.899,86	0,35%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
14	LOCAÇÃO DE OBRA	5.651,03	0,68%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
15	INFRAESTRUTURAL (FUNDAÇÃO)	83.412,26	10,01%			0,00	0,00	100,00	100,00	60,00	60,00				
16	ESTRUTURAL CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	121.351,74	14,56%			0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00				
17	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	50.033,07	6,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	COBERTURA	49.035,56	5,89%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
19	ESCALARIAS METÁLICAS	16.598,55	1,99%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
110	ESCALARIAS DE MADEIRA	22.252,06	2,68%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
111	CONTRAPISO	22.259,36	2,68%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
112	REVESTIMENTO INTERNO	14.405,12	1,73%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
113	REVESTIMENTO DE TETO	78.549,06	9,42%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
114	REVESTIMENTO EXTERNO	22.304,58	2,68%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
115	REVESTIMENTO DE PISO	8.798,97	1,06%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
116	PINTURA INTERNA	10.774,47	1,29%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
117	PINTURA EXTERNA	23.059,53	2,77%			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00				
118	LOÇAS E METAS	19.554,30	2,35%			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00				
120	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8.965,63	1,08%			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00				
121	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO	44.359,82	5,32%			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00				
122	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	724,06	0,09%			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00				
123	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E OXIGÊNIO	5.951,55	0,71%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
124	SISTEMA DE TELEFONIA E LÓGICA	8.120,28	0,97%			0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
125	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPD	9.827,22	1,18%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
126	RECHAMAMENTO EXTERNO	33.111,85	3,97%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
127	RECHAMAMENTO EXTERNO	295,55	0,04%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
128	PAISAGISMO DO JARDIM DE INVERNO	16.654,20	2,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
129	COMPLEMENTOS	1.359,61	0,16%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
130	LIMPEZA FINAL DE OBRA	2.546,04	0,31%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
131	EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO	12.062,87	1,45%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
132	LAJUDOS DE APROVAÇÃO	1.330,90	0,16%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
133	PROJETO DE COMPATIBILIZAÇÃO "AS BUILT"														
Total (R\$):				833.575,45	100,00%	14.337,60	1,72%	42.679,06	5,12%	89.109,22	10,69%	146.125,78	17,53%	268.578,01	32,22%

Cronograma apresentado pela Contratada

Nº da Operação: 13283.4689001/16-0003 Centro/Programa/Modalidade/Ação: MS / Requalifica URS - Construção
 Proposante: Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba Objeto: Implantação de URS no Bairro Relógio

META/AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		
				PARCELA (R\$)	ACUM (R\$)							
1	CONSTRUÇÃO DA URS REFÚGIO	14.301,14	1,72%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	PROJETOS EXECUTIVOS	6.712,03	0,81%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.711,03	0,68%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	LIMPEZA DO TERRENO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.899,86	0,35%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
14	LOCAÇÃO DE OBRA	5.854,08	0,70%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	83.412,26	10,01%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	ESTRUTURAL CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	121.351,74	14,56%	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	ALVENARIA DE VISGÃO	56.305,54	6,72%	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
18	COBERTURA	50.033,07	6,00%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
19	ESQUADRIAS METÁLICAS	49.025,55	5,88%	0,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
110	CONTRAPISO	17.751,06	2,13%	0,00	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
111	REVESTIMENTO INTERNO	12.139,36	1,46%	0,00	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
112	REVESTIMENTO DE TETO	11.981,34	1,44%	0,00	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
113	REVESTIMENTO EXTERNO	16.405,12	1,97%	0,00	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
114	REVESTIMENTOS DE PISO	17.549,06	2,11%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
115	PINTURA INTERNA	12.304,58	1,49%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
116	PINTURA EXTERNA	8.798,97	1,06%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
117	LOUÇAS E METAS	10.771,27	1,29%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
118	BANQUADAS E LAVATÓRIOS DAS SALAS	23.029,53	2,77%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
119	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	19.954,30	2,39%	60,00	80,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
120	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO	8.965,63	1,08%	60,00	80,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
121	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	44.339,82	5,34%	60,00	80,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
122	INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO	524,96	0,01%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
123	SISTEMA DE TELEFONIA E LÓGICA	5.951,55	0,71%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
124	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE OSCILARIAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8.129,49	0,97%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
125	CALCAMENTO/ RAMPA/ ESCADA EXTERNO	9.827,22	1,18%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
126	FECHAMENTO EXTERNO	33.111,83	3,97%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
127	FECHAMENTO DE JARDIM DE INVERNO	295,55	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128	COMPLEMENTOS	18.654,70	2,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1.329,61	0,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO	2.546,04	0,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	LAUDOS DE APROVAÇÃO	12.062,97	1,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	PROJETO DE COMPATIBILIZAÇÃO "AS BUILT"	3.330,90	0,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (%)				14,23%	46,45%	11,24%	57,69%	11,34%	69,03%	14,87%	83,90%	
Total (R\$):				833.575,45	118.617,79	387.195,80	93.693,88	480.889,68	94.527,46	575.417,13	123.952,67	699.369,80

Secretaria Min. de Comp. e Inf. Processo nº 633 Prom. 17879 - Arnaldo Diego M. D. Cruz

Cronograma apresentado pela Contratada

Nº da Operação: 13283.4689001/16-0003 Centro/Programa/Modalidade/Ação: MS / Requalifica URS - Construção
 Proposante: Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba Objeto: Implantação de URS no Bairro Relógio


META/AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		
				PARCELA (R\$)	ACUM (R\$)							
1	CONSTRUÇÃO DA URS REFÚGIO	14.301,14	1,72%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	PROJETOS EXECUTIVOS	6.712,03	0,81%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.711,03	0,68%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	LIMPEZA DO TERRENO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.899,86	0,35%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
14	LOCAÇÃO DE OBRA	5.854,08	0,70%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	83.412,26	10,01%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	ESTRUTURAL CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	121.351,74	14,56%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	ALVENARIA DE VISGÃO	56.305,54	6,72%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
18	COBERTURA	50.033,07	6,00%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
19	ESQUADRIAS METÁLICAS	49.025,55	5,88%	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
110	CONTRAPISO	17.751,06	2,13%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
111	REVESTIMENTO INTERNO	12.139,36	1,46%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
112	REVESTIMENTO DE TETO	11.981,34	1,44%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
113	REVESTIMENTO EXTERNO	16.405,12	1,97%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
114	REVESTIMENTOS DE PISO	17.549,06	2,11%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
115	PINTURA INTERNA	12.304,58	1,49%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
116	PINTURA EXTERNA	8.798,97	1,06%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
117	LOUÇAS E METAS	10.771,27	1,29%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
118	BANQUADAS E LAVATÓRIOS DAS SALAS	23.029,53	2,77%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
119	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	19.954,30	2,39%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
120	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO	8.965,63	1,08%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
121	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	44.339,82	5,34%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
122	INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO	524,96	0,01%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
123	SISTEMA DE TELEFONIA E LÓGICA	5.951,55	0,71%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
124	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE OSCILARIAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8.129,49	0,97%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
125	CALCAMENTO/ RAMPA/ ESCADA EXTERNO	9.827,22	1,18%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
126	FECHAMENTO EXTERNO	33.111,83	3,97%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
127	FECHAMENTO DE JARDIM DE INVERNO	295,55	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128	COMPLEMENTOS	18.654,70	2,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1.329,61	0,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO	2.546,04	0,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	LAUDOS DE APROVAÇÃO	12.062,97	1,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	PROJETO DE COMPATIBILIZAÇÃO "AS BUILT"	3.330,90	0,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (%)				5,87%	89,77%	3,73%	93,50%	2,46%	95,96%	4,04%	83,57%	
Total (R\$):				833.575,45	100,00%	48.930,88	748.300,68	31.092,36	779.393,05	20.505,96	799.899,00	33.676,45

Rua Jovina, 470 - 2º Andar - Santana - CEP: 02036-001 - São Paulo - SP - Fone: 3876-1160 - 11


Coplem Engº e Empreendimentos Ltda. José Fernando de Castro CREA-SP: 006065089-0

Secretaria Min. de Comp. e Inf. Processo nº 633 Prom. 17879 - Arnaldo Diego M. D. Cruz


1º Termo de Prorrogação




2º Termo de Prorrogação




3º Termo de Prorrogação



4º Termo de Prorrogação



Notificações emitidas pela Municipalidade à Contratada

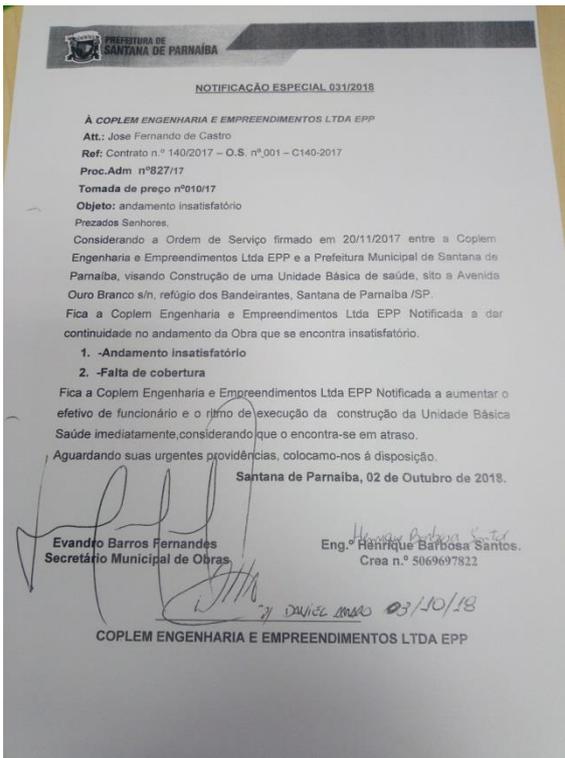

Abaixo anexamos fotos da atual situação da obra, quando da visita realizada pela fiscalização no dia 29/05/2019.



